Harmonogram stavby: Revitalizácia priestorov námestia sv. Egídia v Poprade

Identifil		Režin úlohy	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie
1			**I. ETAPA**	**Po 18.5.26**	**Pi 12.2.27**
2			zriadenie a vybudovanie staveniska	Po 18.5.26	Št 4.6.26
3			vyčistenie a odstránenie ZS	Pi 29.1.27	Pi 12.2.27
4			**SO 01.01 - SPEVNENÉ PLOCHY**	**Pi 29.5.26**	**Št 14.1.27**
5			búracie práce	Pi 29.5.26	Št 17.9.26
6			výkopové práce do úrovne -0,50 m	Št 9.7.26	Po 23.11.26
7			podkladné vrstvy a okrajové prvky	Str 1.7.26	Pi 11.12.26
8			finálne vrstvy spevnených plôch	Pi 31.7.26	Št 14.1.27
9			**SO 02 Odberné elektrické zariadenia**	Pi 21.8.26	Str 23.12.26
10			**SO 02.1 Dažďová kanalizácia**	**Pi 19.6.26**	**Ut 22.12.26**
11			retenčné nádrže	Str 29.7.26	Po 5.10.26
12			podzemné dažďové rozvody	Pi 19.6.26	Pi 23.10.26
13			výmena poklopov	Po 14.9.26	Ut 22.12.26
14			líniové žlaby a vpuste, drenáž	Pi 14.8.26	Po 14.12.26
15			**SO 03 - Architektonické riešenie**	**Po 25.5.26**	**Ut 12.1.27**
16			búracie práce	Po 25.5.26	Št 17.9.26
17			technologická miestnosť	Po 22.6.26	Št 5.11.26
18			líniové základové konštrukcie	Ut 14.7.26	Str 2.12.26
19			kamenné schodiská, obklady, kamenné bloky	Po 6.7.26	Ut 12.1.27
20			nášlapná vrstva podlahy okolo fontány	Po 31.8.26	Pi 23.10.26
21			**SO 04 - Technológia fontány**	**Pi 12.6.26**	**Str 9.12.26**
22			práce na fontánovej doske	Pi 12.6.26	Pi 18.9.26
23			práce mimo fontánovej dosky	Po 27.7.26	Str 9.12.26
24			**SO 05.01 Vodovodné a kanalizačné prípojky**	Ut 30.6.26	Pi 2.10.26
25			**SO 05.02 Prekládka plynového potrubia**	Pi 19.6.26	Št 10.9.26
26			**SO 06 - KRAJINO-ARCHITEKTONICKÉ ÚPRAVY**	**Po 24.8.26**	**Str 3.2.27**
27			prekoreniteľné bunky	Po 24.8.26	Po 30.11.26
28			ostatné práce	Po 24.8.26	Str 3.2.27
29			**Odberné elektrické zariadenia - VO**	**Po 31.8.26**	**Str 9.12.26**
30			Montáž	Po 31.8.26	Str 9.12.26
31			Materiál	Po 31.8.26	Ut 8.12.26
32			Rekapitulácia	Po 14.9.26	Po 7.12.26
33			**SO 08.1 Elektroinštalácia - silnoprúd**		
34			Elektroinštalácia	Po 31.8.26	Ut 29.12.26
35			Rozvádzače	Po 7.9.26	Št 14.1.27
36			Výsuvné stlpíky	Ut 15.9.26	Ut 5.1.27
37			Repro sústava	Str 9.9.26	Po 4.1.27
38			CCTV	Str 9.9.26	Pi 1.1.27
39			Dátová infraštruktúra	Str 9.9.26	Št 7.1.27
40			Demontážne práce	Po 7.9.26	Str 27.1.27
41			**SO 08.2 Elektroinštalácia verejného osvetlenia**	**Ut 1.9.26**	**Po 8.2.27**
42			Elektroinštalácia	Ut 1.9.26	Ut 5.1.27
43			Rozvádzače	Po 7.9.26	Pi 8.1.27
44			Osvetlenie	Po 14.9.26	Št 14.1.27
45			DALI systém a ovládanie	Ut 22.9.26	Str 23.12.26
46			Demontážne práce	Str 9.9.26	Str 3.2.27
47			Ostatné pridružené úkony	Pi 18.9.26	Po 8.2.27
48			**SO 09 Drobná architektúra**	**Št 3.9.26**	**Pi 12.2.27**
49			výkopové práce a základové konštrukcie pod úroveň -0,6 m	Str 9.9.26	Po 14.12.26
50			výkopové práce a základové konštrukcie nad úroveň -0,45 m	Po 14.9.26	Po 21.12.26
51			osadenie oceľových obrubníkov	Po 21.9.26	Po 21.12.26
52			konštrukcia podlahy okolo fontány a dvojité dno	Št 3.9.26	Pi 13.11.26
53			osadenie prvkov drobnej architektúry	Št 1.10.26	Pi 12.2.27
54			**II. ETAPA**	**Št 9.7.26**	**Pi 12.2.27**
55			**ZARIADENIE STAVENISKA pre I. a II etapu**	**Št 9.7.26**	**Pi 12.2.27**
56			zriadenie a vybudovanie staveniska	Št 9.7.26	Št 23.7.26
57			vyčistenie a odstránenie ZS	Po 1.2.27	Pi 12.2.27
58			**SO 03 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE**	**Po 7.9.26**	**Št 4.2.27**
59			búracie práce	Po 7.9.26	Št 17.12.26
60			základové konštrukcie	Ut 22.9.26	Ut 19.1.27
61			kamenné schodiská, obklady, kamenná bloky	Po 21.9.26	Št 4.2.27
62			**SO 02 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA**	**Po 7.9.26**	**Pi 8.1.27**
63			retenčné nádrže	Po 7.9.26	Str 18.11.26
64			podzemné dažďové rozvody	Str 16.9.26	Št 7.1.27
65			výmena poklopov	Po 12.10.26	Po 21.12.26
66			líniové žlaby a vpuste, drenáž	Po 21.9.26	Pi 8.1.27
67			**Elektromontáže**	**Pi 25.9.26**	**Po 8.2.27**
68			**SO 03.1 – VEREJNÉ OSVETLENIE**	**Pi 25.9.26**	**Št 14.1.27**
69			búracie práce a základové konštrukcie	Pi 25.9.26	Po 14.12.26
70			doplnkové výkopové práce a trasovanie	Pi 25.9.26	Št 14.1.27
71			osádzanie svietidiel a dokončovacie práce	Ut 6.10.26	Ut 5.1.27
72			**SO 03.2 - ELEKTROINŠTALÁCIA NÁMESTIA**	Po 28.9.26	Po 18.1.27
73			**SO 03.3 - KAMEROVÝ SYSTÉM**	Pi 16.10.26	Po 8.2.27
74			**SO 04 - Sadové úpravy**	**Po 21.9.26**	**Št 28.1.27**
75			rozrušenia pôdy do hĺbky 150 mm, sadové jamy	Pi 2.10.26	Ut 1.12.26
76			závlaha	Pi 16.10.26	Št 28.1.27
77			výsadba drevín	Str 21.10.26	Ut 22.12.26
78			výsadba trávnika a okrasných kvetov	Po 21.9.26	Pi 25.12.26
79			**SO 05 - SPEVNENÉ PLOCHY**	**Po 7.9.26**	**Št 4.2.27**
80			búracie práce	Po 7.9.26	Str 23.12.26
81			výkopové práce do úrovne -0,520m	Po 14.9.26	Str 27.1.27
82			podkladné vrstvy a okrajové prvky	Po 21.9.26	Pi 29.1.27
83			finálne vrstvy spevnených plôch	Po 28.9.26	Št 4.2.27
84			**SO 06 - Mobiliar a drobné objekty**	**Po 21.9.26**	**Str 10.2.27**
85			výkopové práce a základové konštrukcie pod úroveň -0,600	Po 21.9.26	Po 28.12.26
86			výkopové práce a základové konštrukcie nad úroveň-0,450	Po 28.9.26	Št 21.1.27
87			osadenie oceľových obrubnikov	Po 12.10.26	Po 1.2.27
88			osadenie prvkov drobnej architektúry	Št 29.10.26	Str 10.2.27

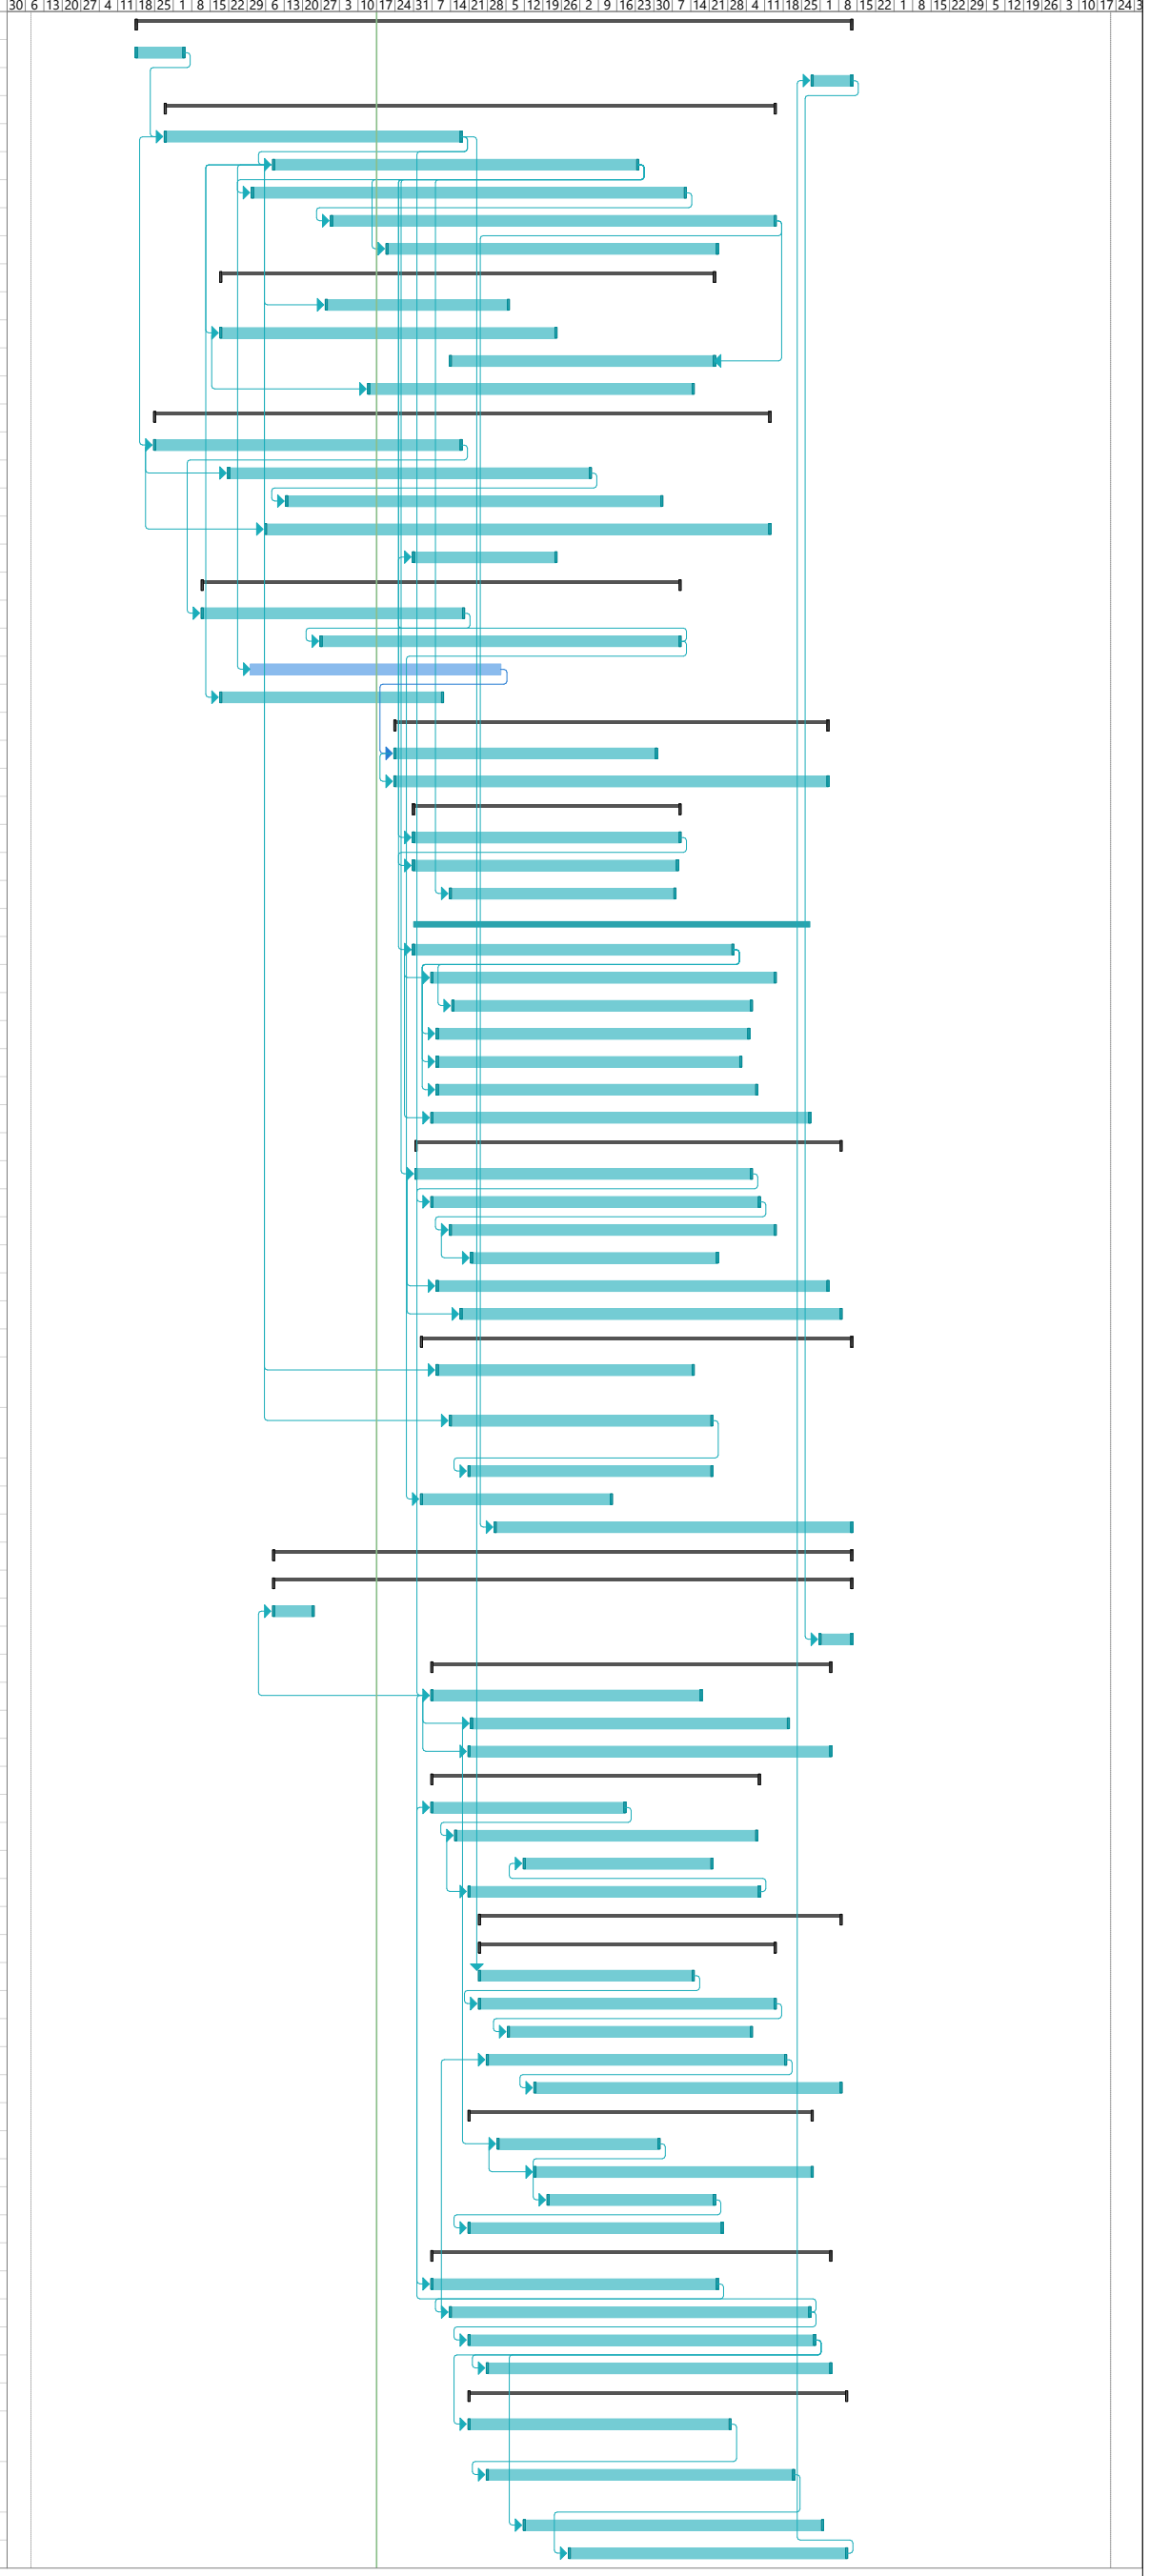

HMG stavby

Úloha | Súhrn projektu | Manuálna úloha | Iba začiatok | Termín
Rozdeliť | Neaktívna úloha | Iba trvanie | Iba dokončiť | Priebeh
Medzník | Neaktívny medzník | Manuálny súhrn | Externé úlohy | Manuálny priebeh
Súhrn | Neaktívny súhrn | Manuálny súhrn | Externý medzník
